



Projekt: AAN SL Bildsø Strand kloakering - AO_0001068
Projekt nr.: 523010102032-00001
Møde: nr. 1
Dato: 22. oktober 2018 kl. 19-21
Sted: Stillingehallen, Stillingevej 74, 4200

SK Forsyning A/S

Deltagere:	Navn	
	Anders Florup Nielsen	SK Forsyning
	Torben Kofoed	SK Forsyning
	Jette Nielsen	Orbicon
	Andreas Tronier Hansen	Orbicon
	Thomas Kirkegaard Nielsen	Gorm Hansen & Søn
	Torben Larsen	Gorm Hansen & Søn
	Ca. 100 sommerhusejere	

Nedenstående spørgsmål blev stillet af sommerhusejerne i forbindelse med det afholdte informationsmøde vedr. Bildsø Strand, etape 6.2.

Hvad kan dæksler på skelbrønde tåle af last?

Svar: Dækslerne kan tåle op til 40 tons så man kan uden problemer køre hen over det. Det er et kørefast dæksel.

Hvad skal der ske med den gamle septictank el. samletank i forbindelse med tilslutningen?

Svar: Den skal nedlægges i forbindelse med kloakmesterens tilslutningsarbejde. Der er flere muligheder – kan f.eks. tilfyldes, ombygges til gennemløbsbrønd eller bruges til opsamling af regnvand. Snak med jeres egen kloakmester om mulighederne.

Vil projekttegningerne blive tilgængelige i digital form?

Svar: Nej, da projekttegningerne løbende bliver revideret undervejs i projektet. Når hele Bildsø (begge etaper) kloakeringsprojektet er afsluttet vil de udførte ledninger kunne ses via SK forsynings hjemmeside (ledningsportal).

Der er mange dræn i området hvad gør i for at passe på disse?

Svar: Alle kendte informationer (fra grundejerforeninger mv.) om placering af dræn er indtegnet på projekttegningerne. Evt. overgravede dræn registreres og repareres selvfølgelig.

Støjer minipumpestationerne?

Svar: Det er ikke vores erfaring at der er støjgener. Minipumperne kører typisk få gange i døgnet nogle få minutter ad gangen.


På hvilken side af Stendyssevej lægges kloakledningen?

Svar: Vest for østersvej anlægges kloakledning som gravitationsledning midt i vejen. Øst for Østersvej anlægges kloakledning som trykledning i vejens sydlige side

Beskæring af udragende bevoksning over vej, er det 4m i højden

Svar: Det er Slagelse kommune der fastsætter retningslinjer. Vejledning kan ses på kommunens hjemmeside: <https://www.slagelse.dk/borger/bolig-og-affald/min-bolig/grundejeres-pligter/beskaering-af-beplantning>

Nedenstående principskitse er fra kommunens egen hjemmeside:

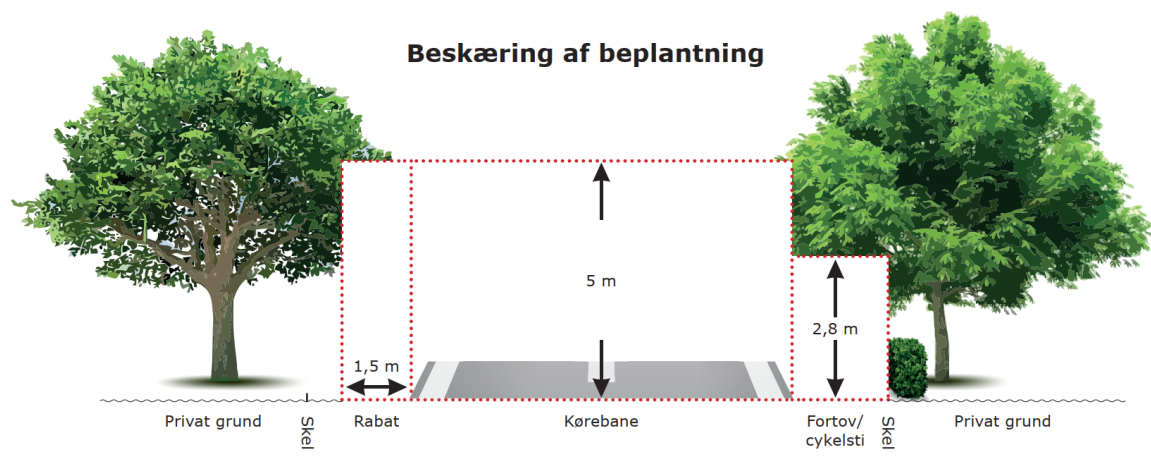

Hvordan vil adgangsforholdene være i området omkring juleferien?

Svar: Eftersom entreprenøren også holder juleferie vil han sørge for at der er ryddet så meget op som muligt, og ligeledes at huller så meget som muligt er dækket op således der er adgang.
